

Jour fixe #01

Team Leap



Unser Team



Von links nach rechts:

Dominik Koschik - **Projektleiter**

Sophie Humbert - **Design**

Jonas Fügen - **Scrum Master**


Eddi Bludau - **Design**

Julian Komarek - **Entwickler**

Yan Wittmann - **Entwickler**

Lauritz Fuchs - **Entwickler**

Überblick

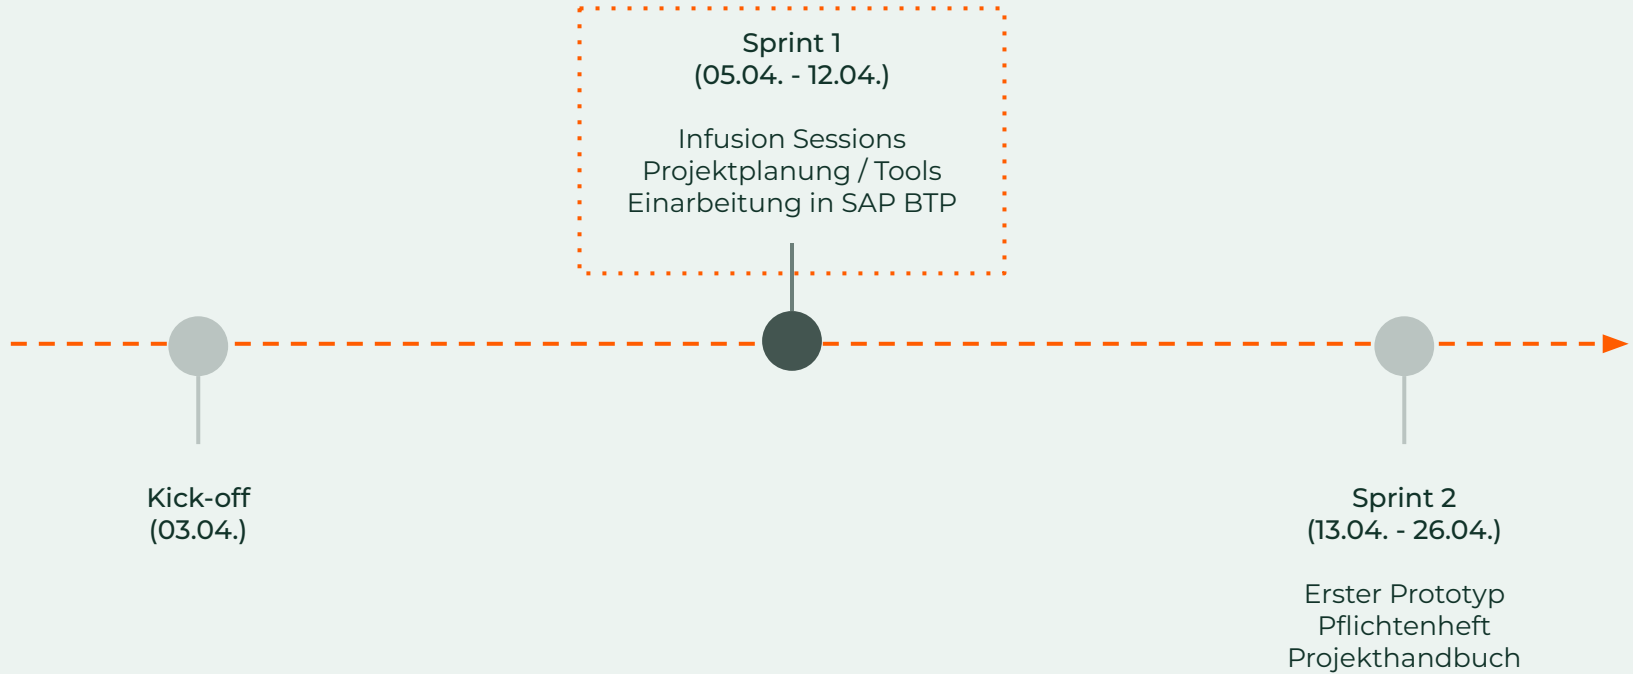

Sprint 0: 06.04.23 - 12.04.23

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Offen	Fertig
Dokumentation	Jour fixe Präsentation	15	19	-4	J
	Fragenkatalog	10	1	9	N
	Steckbrief	1	1	0	J
Organisation	Teamregeln	4	2	2	N
	Rollenverteilung	3	1	2	J
	Daily Scrum	3	1	2	J
	Sprint-Review/Retro	5	0	5	N
Entwicklung/Design	Webseite erstellen	2	3	-1	J
	Logo/Foliensatz	5	7	-2	J
	Kontextanalyse	10	15	-5	N
	Infusion Sessions	55	55	0	J
	Einarbeitung SAP BTP	30	10	20	N
Summe		143	115	28	


Alle Angaben in Personenstunden (ph)

Sprint 1: 13.04.23 - 27.04.23

Kategorie	Grobe Arbeitspakete	Geplant
Dokumentation	Projekthandbuch erstellen (25) Pflichtenheft anfertigen (48) Präsentationsfolien erstellen (6)	81
Organisation	Teammeeting(20) Daily Scrum (25) Sprint-Review, Retro (5,5)	82
Entwicklung/Design	Prototyp erstellen (40) SAP BTP Einarbeitung (30)	70
Sonstiges	Fach Englisch(55) Besuch sovanta (6) Team bildende Maßnahmen (20)	81
Summe		314

Alle Angaben in Personenstunden (ph)

Risiken

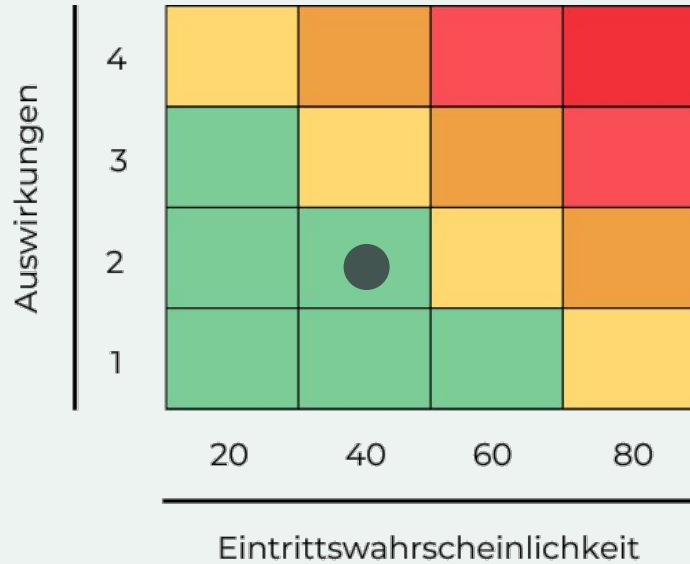


RS1 - Sprintplanung muss auf nächsten Sprint verschoben werden

Indikator: Geplante PH für Sprintplanung überschreiten Sprintende.

Präventiv: Sprintplanung bereits 1-2 Tage vor Sprintende fertigstellen.

Reaktiv: Sprintplanung am Anfang des nächsten Sprints aufstellen.

Risiken

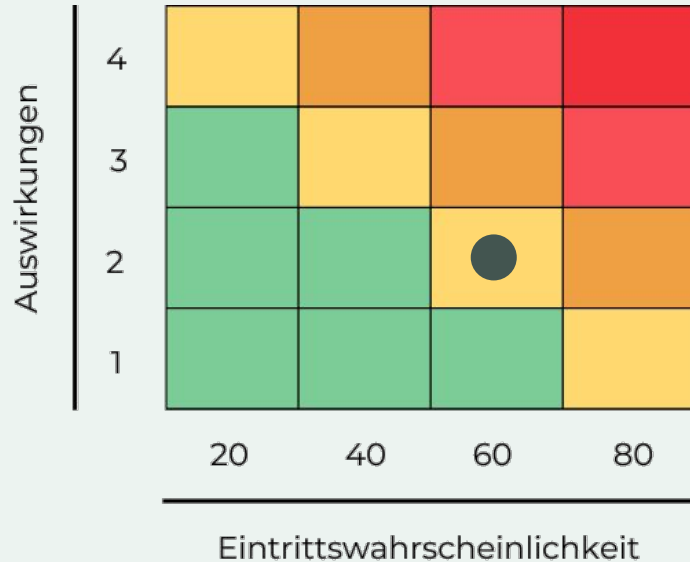

RS2 - Anforderungskatalog nicht erstellbar aufgrund zu hoher BTP Komplexität

Indikator: Zur ersten Sprechstunde am 14.04 keinen konkreten Fragenkatalog

Präventiv: Zwei Experten für SAP BTP auswählen

Reaktiv: Neues Kundengespräch vor nächster Sprechstunde festlegen

Was lief gut?

- Planung
- Workflow und Tools
- Teambuilding
- Arbeitsaufteilung

Nächster Sprint

- Kundengespräche
- Pflichtenheft anlegen
- Mehr Recherche zur SAP BTP betreiben
- Erster Prototyp
- Projekthandbuch

Projektampel

