


# Jour fixe 03

Präsentator: Julian Komarek



# Überblick

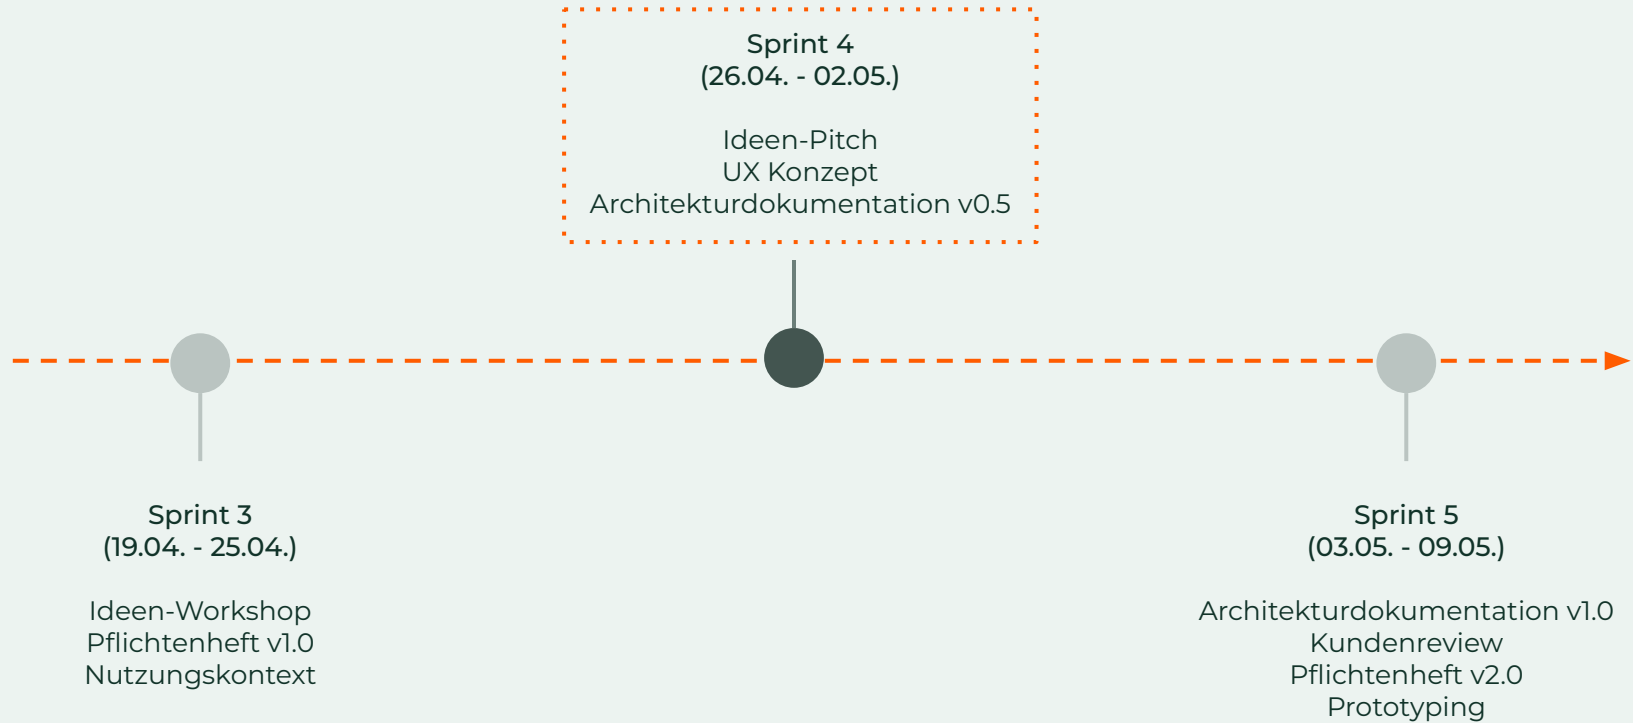

## Highlights

Produkttyp festgelegt  
durch Ideen Pitch

Ressourcen werden von  
sovanta bereitgestellt

## Probleme

Ausfall von 2 Mitgliedern  
aufgrund von Krankheit

Unterschiedliche  
Vorstellungen vom  
Endprodukt



## Lösungen

Teambuilding wegen  
niedriger Priorität  
verschoben

Gemeinsame  
Produktvorstellung  
ausarbeiten



# Sprint 4: 26.04.23 - 02.05.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Diff.	Status	Rest
Meetings	Teaminterne Meetings	14	14	0	✓	
	Kundengespräch	5	3	-2	✓	
	Review 26.04.	20	14	-6	✓	
UX Konzept	User Journey und Happy Path	10	12	2	✓	
	High-Level Projektplan	7	8	1	✓	
	Human-centered design	11	5	-6	✓	
Folien	Jour fixe Folien erstellen	5	10	5	✓	
	Ideen-Pitch Folien erstellen	7	13	6	✓	
Dokumente	Architekturdokumentation erstellen	20	14	-6	✓	
	Projekthandbuch erweitern	3	2	-1	✓	
	<input type="checkbox"/> Anforderungen ergänzen	3	4	1	✓	
	* Qualitätssicherung überarbeiten	0	3	3	✓	
Sonstiges	Fachenglisch	8	8	0	✓	
	Teambuilding	10	0	-10	x	
	Ressourcenbeschaffung	3	2	-1	✓	
	Abnahme von Dokumenten	2	0	-2	→	2
	* Review Feedback zu anderen Teams	0	3	3	✓	
Summe	(6h · 4d · 3 Personen) + (7h · 4d · 2 Personen) = 128 ph	128	115	-13		2




# Sprint 5: 03.05.23 - 09.05.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll
Meetings	Teaminterne Meetings	14
	Teamworkshop	6
	Kundengespräche	8
	Jour fixe	16
Prototyp	Prototypen erstellen	22
	Hardware Konzept ausarbeiten	10
	Software Konzept ausarbeiten	13
Folien	Review Folien erstellen	9
	Kundenreview Folien erstellen	8
Dokumente	Pflichtenheft erweitern	4
	Architekturdokumentation v1.0	28
	Projekthandbuch erweitern	3
Sonstiges	Fachenglisch	17
	<input type="checkbox"/> Abnahme von Dokumenten	2
Summe	$(6h \cdot 5d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 5d \cdot 2 \text{ Personen}) = 160 \text{ ph}$	160



# Risiken

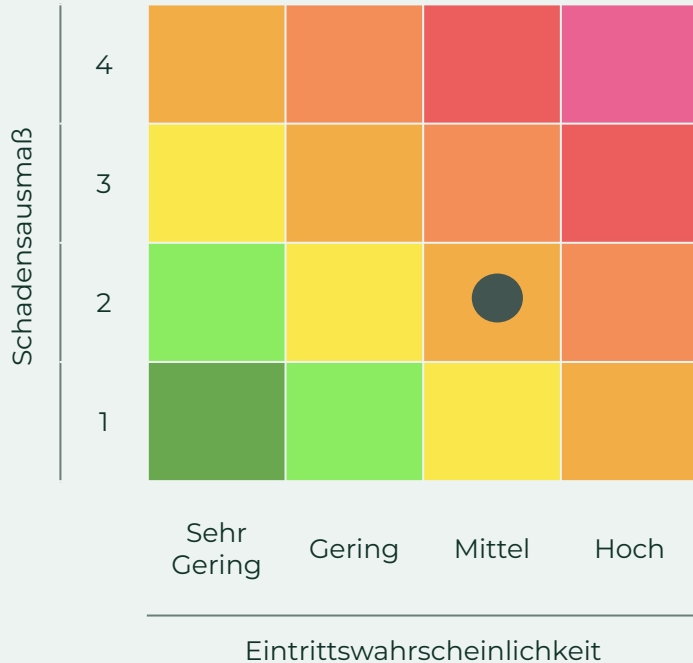

RS6 - Service Bausteine sind mit ihren vorgesehenen Funktionen nicht umsetzbar

**Indikator:** Nach dem Kundentermin (04.05) steht fest, dass die geplanten Bausteine nicht umsetzbar sind.

**Präventiv:** Servicebausteine granular ausarbeiten und zusätzliche alternative Bausteine vorbereiten.

**Reaktiv:** Servicebausteine neu planen oder auf Alternativen ausweichen und diese von sovanta bestätigen lassen.

**Wahrscheinlichkeit:**

[Sehr gering = 0 - 20 %] [Gering = 20 - 40 %]  
[Mittel = 40 - 70 %] [Hoch = 70 % <]

**Schadensausmaß:**

[1 = 5 - 20 PH] [2 = 20 - 40 PH]  
[3 = 40 - 80 PH] [4 = 80 PH <]

# Projektampel

- Meilensteine trotz Ausfällen eingehalten
- Klare Richtung des Endprodukts steht nach dem Ideen-Pitch fest

