


# Jour fixe 04

Präsentator: Dominik Koschik



# Überblick

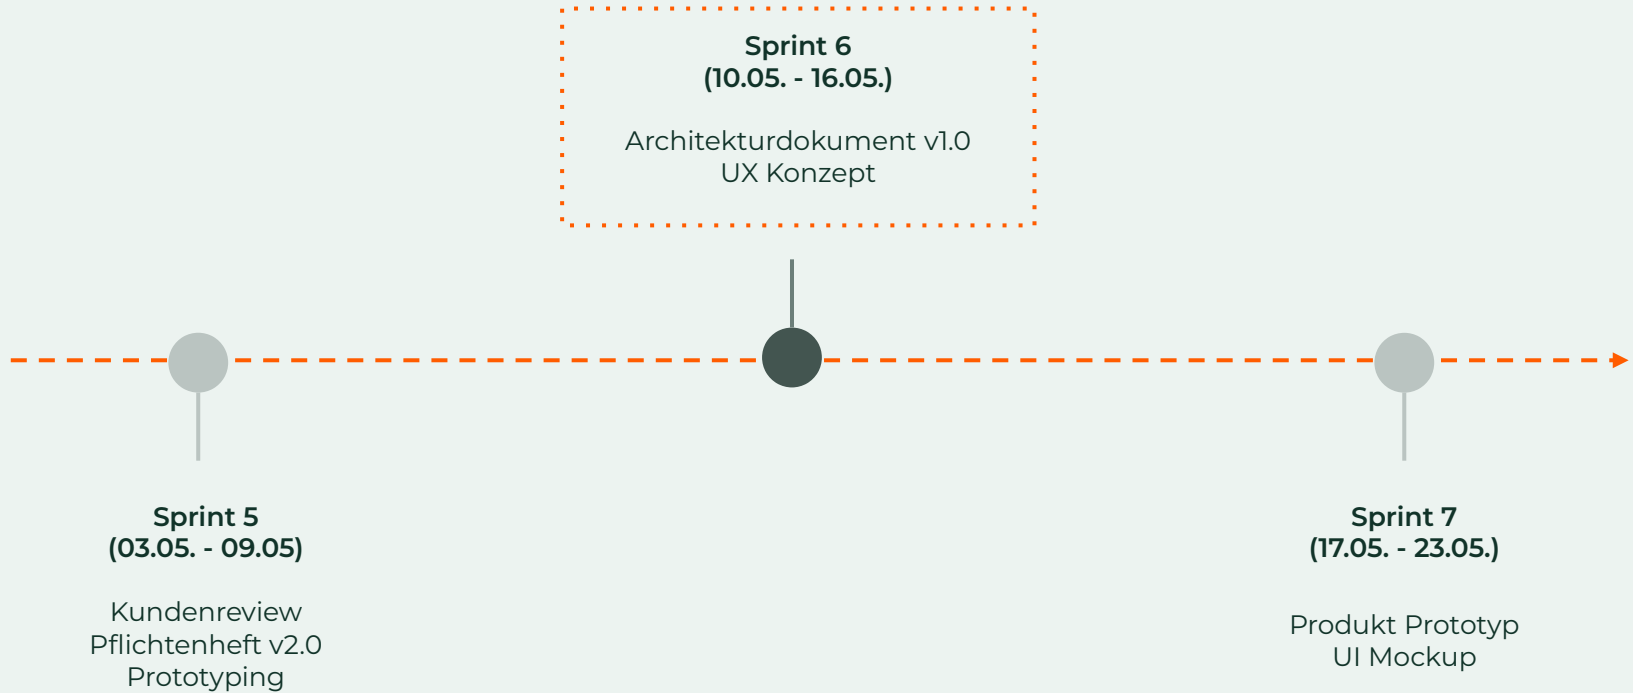

# Rückblick Sprint 6: 10.5.23 - 16.05.23

## Highlights

Hardware ist angekommen

## Herausforderungen

Architekturdokumentation aufwendiger als gedacht

Krankheit eines Teammitglieds

## Lösungen

Personenstunden aus anderen Arbeitspaketen aufwenden

Arbeitspaket mit niedriger Priorität verschieben



# Rückblick Sprint 6: 10.5.23 - 16.05.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Diff.	Status	Rest
Meetings	Teaminterne Meetings	13	12	-1		
	Kundengespräch	3	2	-1		
	Review 10.05.	20	22	2		
Entwicklung / Design	UI Mockup	15	0	-15	→	13
	UX Konzept	11	10	-1		
	Entwickler einarbeiten	17	18	1		
	Projekt aufsetzen	7	11	4		
Folien	Jour fixe Folien erstellen	5	5	0		
Dokumente	Pflichtenheft	5	6	1		
	Projekthandbuch	5	6	1		
	→ Architekturdokumentation v1.0	35	44	9		
Sonstiges	Fachenglisch	24	16	-8		
Summe	$(6h \cdot 5d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 5d \cdot 2 \text{ Personen}) - 7h = 153ph$	160	152	-8		13




# Ausblick Sprint 07: 17.05.23 - 23.05.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll
Meetings	Teaminterne Meetings Kundengespräch Jour fixe 17.05	19 3 16
Entwicklung / Design	Hardware Prototyp Software Prototyp → UI Mockup	21 29 13
Folien	Review Folien	9
Dokumente	Pflichtenheft Projekthandbuch	12 8
Summe	$(6h \cdot 4d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 4d \cdot 2 \text{ Personen}) = 128ph$	130



# Risiken

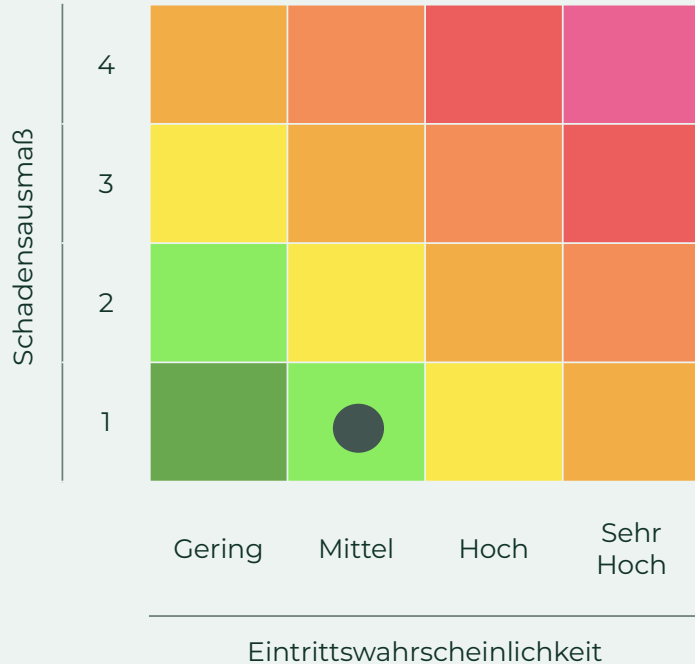

## RS9 - Streik der Deutschen Bahn oder RNV

**Indikator:** Es wird bekannt gegeben, dass zwischen 17.05 - 24.05. gestreikt wird

**Präventiv:** Ausweichtermine bereitstellen für Arbeitspakete, welche Präsenz verlangen

**Reaktiv:** Teammitglieder arbeiten im Homeoffice und schalten sich per Discord dazu

### Wahrscheinlichkeit:

Gering [1 - 20 %] Mittel [21 - 40 %]  
Hoch [41 - 70 %] Sehr Hoch [> 70 %]

### Schadensausmaß:

1 [5 - 20 ph] 2 [21 - 40 ph]  
3 [41 - 80 ph] 4 [> 80 ph]



# Projektampel

- Gute Teamstimmung
- Hardware wurde geliefert

