

# Jour fixe 06

Präsentator: Julian Komarek



# Überblick



# Rückblick Sprint 10: 14.06.23 - 20.06.23

## Highlights

Board und Disketten sind gefärbt

Letzte App Konfiguration wurde fertiggestellt

Chatbot implementiert

## Herausforderungen

Einfärben des Boards verhindert Hardware und Nutzertests

Überarbeitung der Architekturdokumentation zeitintensiver als erwartet



## Lösungen

Hardware und Nutzertests verschieben und Dokumente überarbeiten vorziehen

Überstunden



# Rückblick Sprint 10: 14.06.23 - 20.06.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Diff.	Status	Rest
Meetings	Teaminterne Meetings	12	10	-2	✓	
	Review 14.06.	16	16	0	✓	
Entwicklung / Design	Vierte App-Konfiguration entwickeln	18	17	-1	✓	
	Chatbot entwickeln	6	8	2	✓	
	Styling der restlichen Screens	20	25	5	✓	
	Hardware designen und färben	22	20	-2	→	3
Testen	Backend Tests	14	13	-1	✓	
	Hardware Tests	8	3	-5	→	6
Folien	Jour fixe Folien erstellen	5	4	-1	✓	
	Abschlusspräsentation Inhalt und Struktur	14	18	4	✓	
Dokumente	→ Pflichtenheft v3.0	9	2	-7	→	5
	Architekturdokumentation v2.0	13	19	6	✓	
	* Code und Hardware Dokumentation überarbeiten	0	7	7	✓	
Summe	(6h · 5d · 3 Personen) + (7h · 5d · 2 Personen) - 7h = 153ph	157	162	5		14




# Ausblick Sprint 11: 21.06.23 - 26.06.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll
Meetings	Teaminterne Meetings	5
	Jour fixe 21.06.	12
	Abschlusspräsentation	20
Entwicklung / Design	Bug Fixing betreiben	14
	Testen aller Komponenten	9
	Nutzertests	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hardware designen und färben</li> <li>➤ Hardwaretests</li> </ul>	3 6
Folien	Abschlusspräsentation fertigstellen	54
Dokumente	Dokumente abgabefertig machen	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Code und Hardware Dokumentation überarbeiten</li> </ul>	<del>12</del>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pflichtenheft v3.0</li> </ul>	5
Summe	$(6h \cdot 4d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 4d \cdot 2 \text{ Personen}) = 128ph$	141



# Risiken

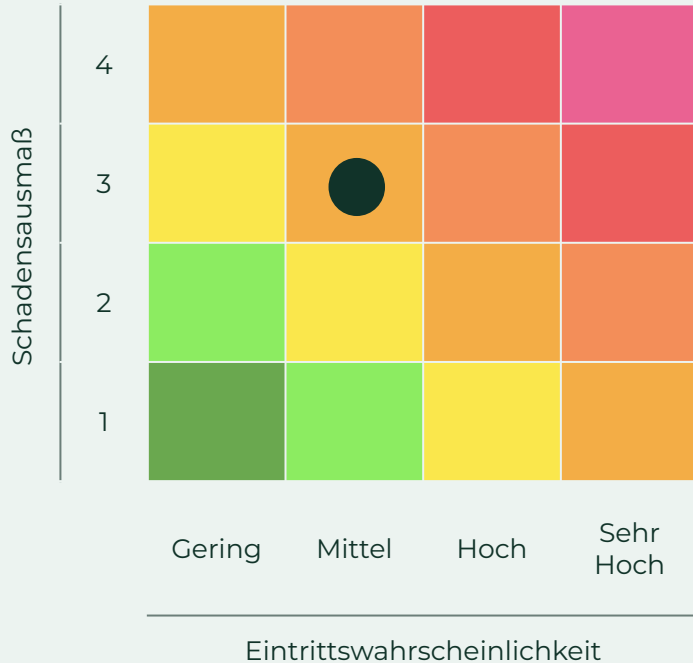


RS12 - Ausfall der eigenen Hardware während der Abschlusspräsentation

**Indikator:** Das Hardwareboard ist zum 26.06 während der Präsentation nicht funktionsbereit

**Präventiv:** Softwarealternative bereitstellen und mit dieser die Präsentation proben

**Reaktiv:** Softwarealternative verwenden

# Risiken

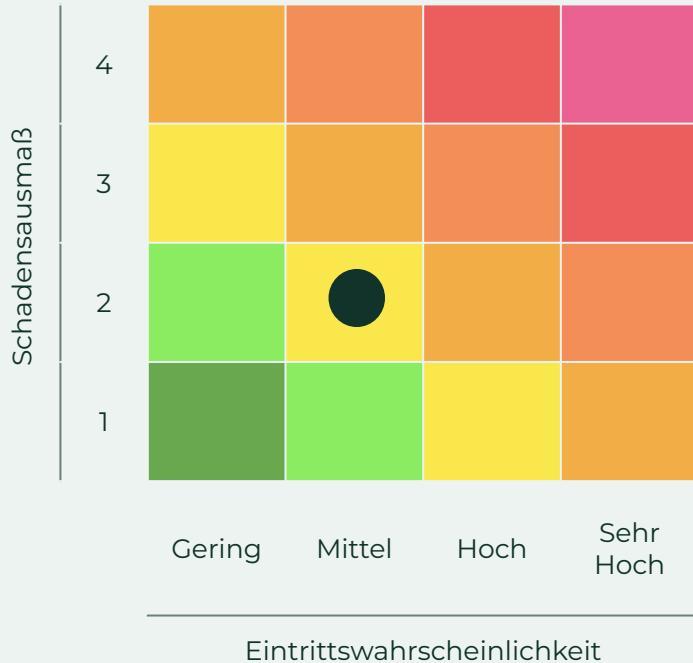


## RS13 - Technische Probleme bei der Abschlusspräsentation

**Indikator:** Die eigene oder von sovanta bereitgestellte Hardware funktioniert während der Abschlusspräsentation nicht

**Präventiv:** Backups für Kabel, Laptop und Präsentationsmonitor bereitstellen und einen Probetermin bei sovanta vereinbaren

**Reaktiv:** Backups einsetzen

# Bugtracking

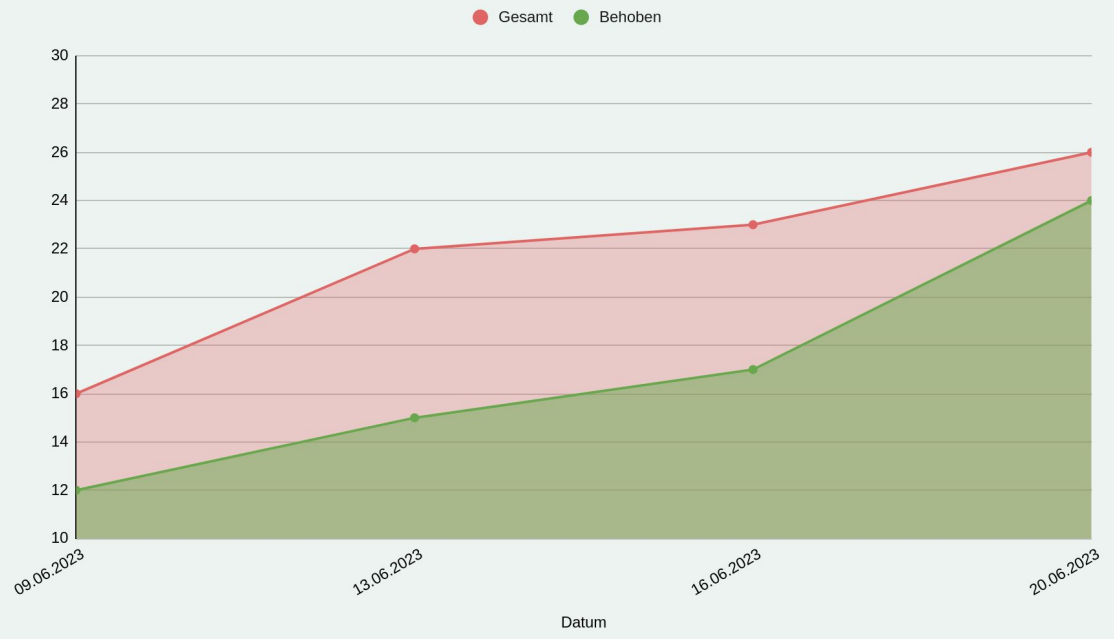



# Projektampel

- Board und Disketten sind gefärbt
- Implementierung geplanter Features wurde abgeschlossen
- Teamstimmung ist gut

