


Review 03

Präsentatoren: Julian Komarek / Lauritz Fuchs



Überblick

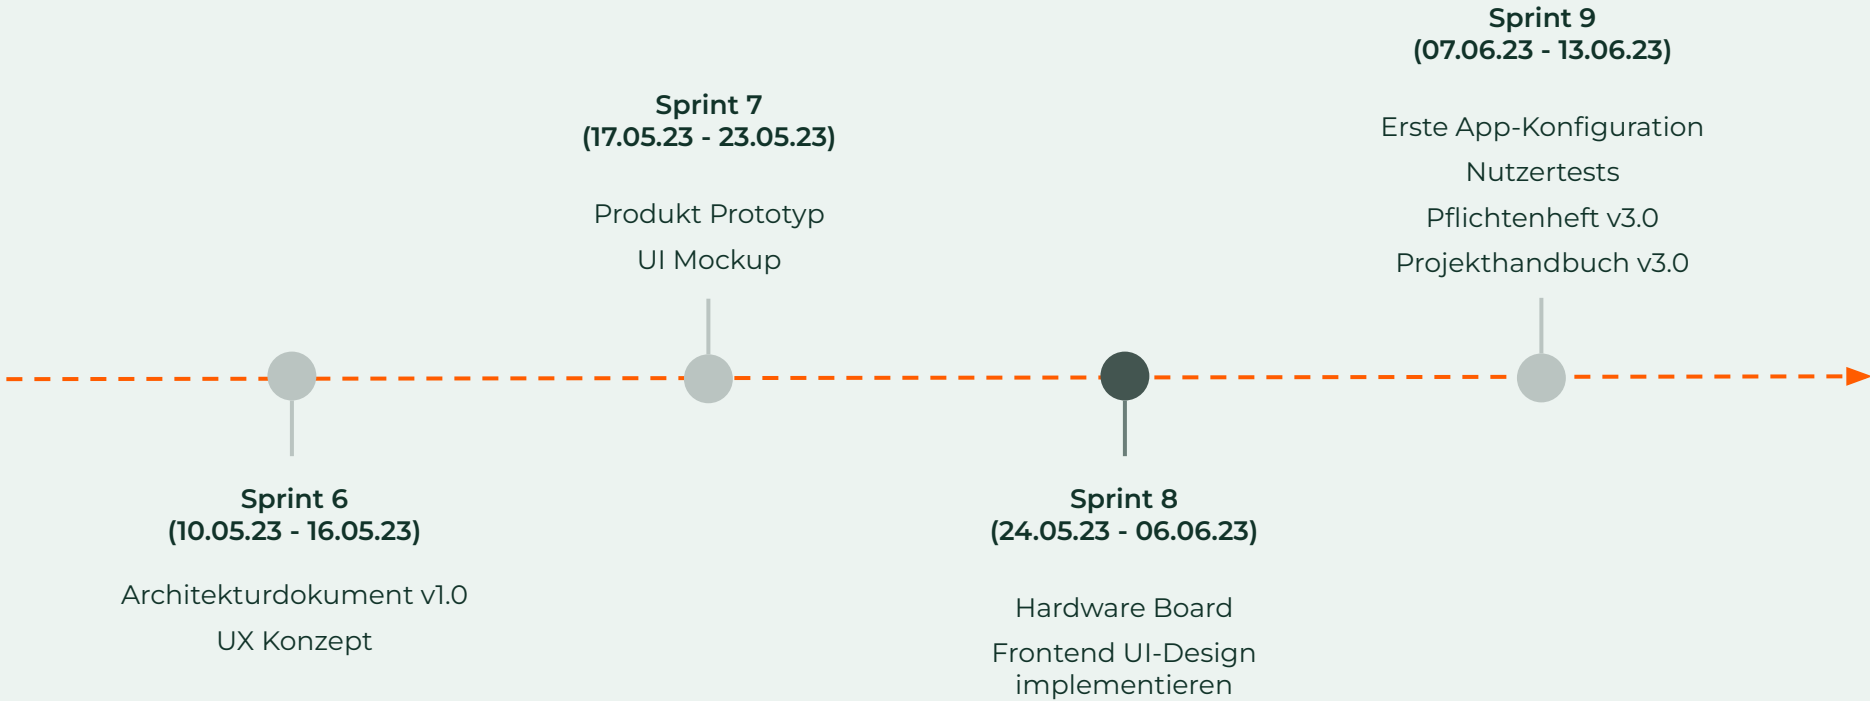

Rückblick Sprint 06: 10.05.23 - 16.05.23


Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Diff.	Status	Rest
Meetings	Teaminterne Meetings	13	12	-1	✓	
	Kundengespräch	3	2	-1	✓	
	Review 10.05.	20	22	2	✓	
Entwicklung / Design	UI Mockup	15	0	-15	→	13
	UX Konzept	11	10	-1	✓	
	Entwickler einarbeiten Projekt aufsetzen	17 7	18 11	1 4	✓ ✓	
Folien	Jour fixe Folien erstellen	5	5	0	✓	
Dokumente	Pflichtenheft	5	6	1	✓	
	Projekthandbuch	5	6	1	✓	
	→ Architekturdokumentation v1.0	35	44	9	✓	
Sonstiges	Fachenglisch	24	16	-8	✓	
Summe	$(6h \cdot 5d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 5d \cdot 2 \text{ Personen}) - 7h = 153ph$	160	152	-8		13




Highlights:

Erste Iteration der Haupt UI abgeschlossen

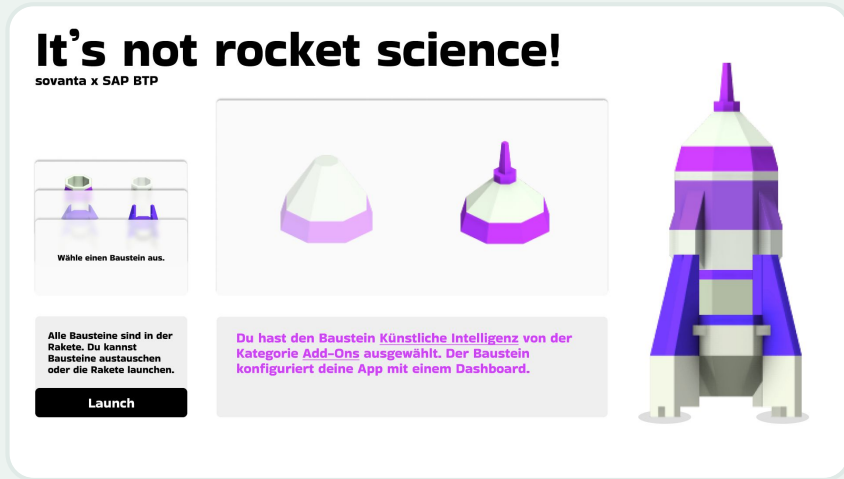

Definition der Applikations-Schnittstellen

Funktionierende Kommunikation zwischen Hardware und Backend

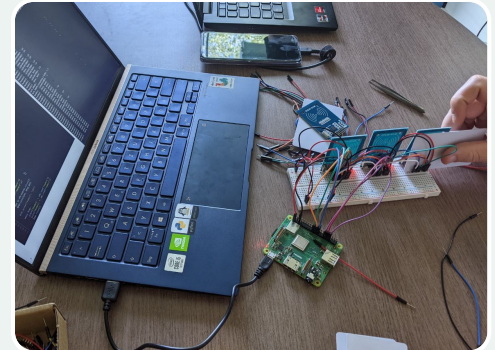

Rückblick Sprint 07: 17.05.23 - 23.05.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll	Ist	Diff.	Status	Rest
Meetings	Teaminterne Meetings	19	15	-4	✓	
	Kundengespräch	3	1	-2	✓	
	Jour fixe 17.05	16	22	6	✓	
Entwicklung / Design	Hardware Prototyp	21	46	25	✓	
	Software Prototyp	29	32	3	✓	
	➔ UI Mockup	13	2	-11	✓	
	* Bug tracking und Testkonzept	0	2	2	✓	
Folien	Review Folien	9	6	-3	✓	
Dokumente	Pflichtenheft v2.0	12	9	-3	✓	
	Projekthandbuch v2.0	8	7	-1	✓	
Summe	(6h · 4d · 3 Personen) + (7h · 4d · 2 Personen) = 128ph	130	142	12		



Ausblick Sprint 08: 24.05.23 - 06.06.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll
Meetings	Teaminterne Meetings Review 24.05. Kundensprechstunde	12 20 3
Entwicklung / Design	Hardwareboard Design Hardwareboard bauen Frontend UI-Design umsetzen Back-End Tests	14 23 22 5
Folien	Fachenglisch Präsentation erstellen Jour fixe Folien erstellen	15 6
Dokumente	Fachenglisch QA Dokument erstellen	16
Sonstiges	Fachenglisch	17
Summe	$(6h \cdot 5d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 5d \cdot 2 \text{ Personen}) - 9h = 151ph$	153




Ausblick Sprint 09: 07.06.23 - 13.06.23

Angaben in Personenstunden

Kategorie	Arbeitspaket	Soll
Meetings	Teaminterne Meetings	12
	Kundenreview	5
	Jour fixe 31.05.	16
Entwicklung / Design	Nutzertestkonzept aufstellen	7
	Nutzertests	10
	Hardwareboard fertigstellen	23
	Erste App-Konfiguration bauen	26
Folien	Kundenreview Folien erstellen	6
	Review Folien erstellen	8
Dokumente	Pflichtenheft v3.0	9
	Projekthandbuch v3.0	5
Summe	$(6h \cdot 4d \cdot 3 \text{ Personen}) + (7h \cdot 4d \cdot 2 \text{ Personen}) = 128ph$	126



Risiken

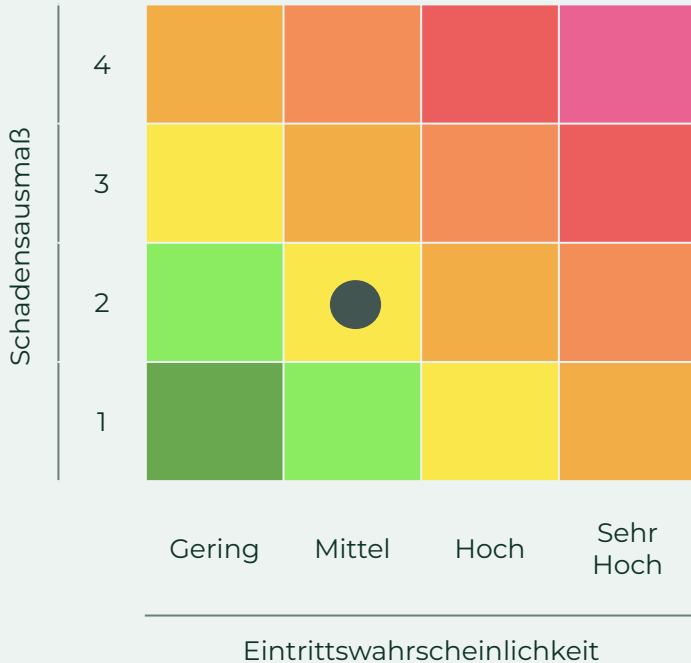

RS10 - Defekte Hardware zum Kundenreview

Indikator: Kommunikation zwischen Hardware und Server funktioniert am 08.06.2023 nicht

Präventiv: Backup zu jeder Hardwarekomponente bereitstellen

Reaktiv: Backup System einsetzen

Wahrscheinlichkeit:

Gering [1 - 20 %] Mittel [21 - 40 %]
Hoch [41 - 70 %] Sehr Hoch [71-99 %]

Schadensausmaß:


1 [5 - 20 ph] 2 [21 - 40 ph]
3 [41 - 80 ph] 4 [>80 ph]

Bug Tracking

Kategorie	Beschreibung
Low	Keine oder kleine Auswirkungen auf die Kernfunktionen, bereiten Benutzern geringe bis keine Unannehmlichkeiten. Werden behoben, wenn Zeit und Ressourcen es erlauben.
Medium	Mäßige Auswirkung auf die Software können einige kleinere Funktionen beeinflussen.
High	Ernsthafte Fehler, die Schlüsselfunktionen beeinflussen. Sollten so schnell wie möglich gelöst werden.




Bug Tracking

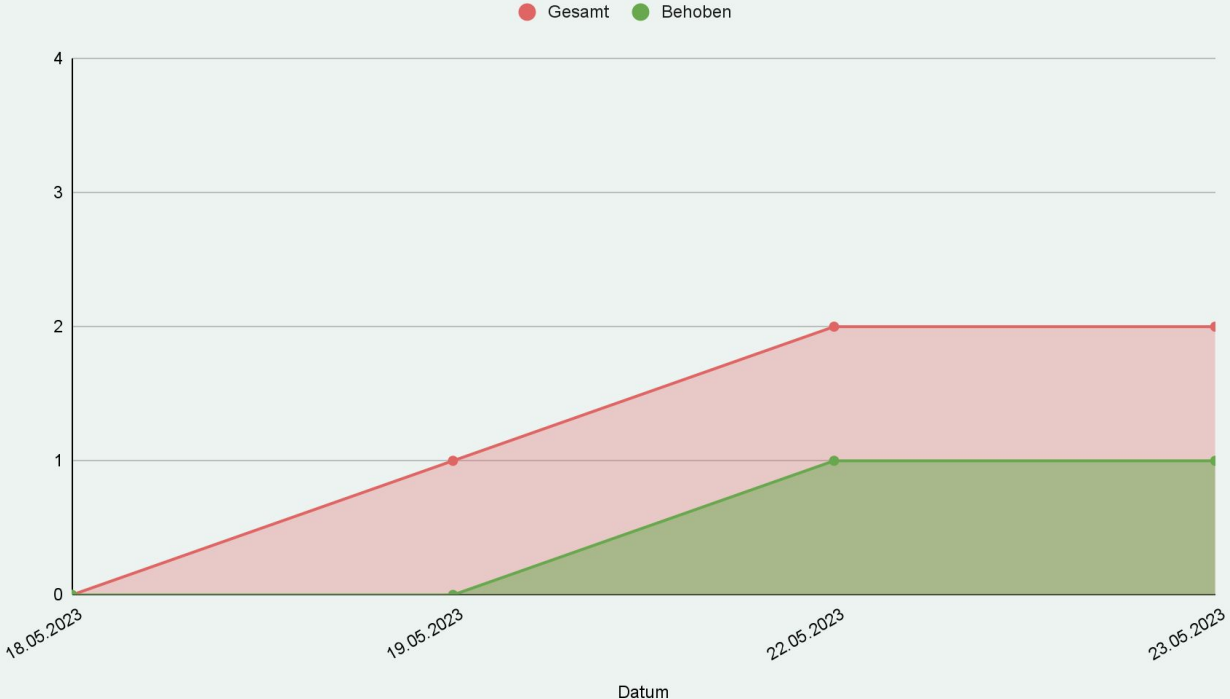

Projektampel

- Teamstimmung ist gut
- UI-Design bereit zur Abnahme
- Hardware zu Backend-Kommunikation steht
- Backend-Logik nahezu abgeschlossen



Produktdemo

